



Nom Câble :
Origine : Site A
Id travail :

Nom Fibre : Fiber 15
Extrémité : Site B
Opérateur :

MTS 4000(S/N 26426)

4136 MA(S/N 28613)

Date : 15/08/2018 20:51

Setup

OTDR

1310nm

30ns

10km

64cm

10.0s

1.47320

-79.0 dB

Alarmes

Seuils

None

Résumé

Nom Fichier

Laser nm Bilan dB ORL Liaison dB Fin de fibre Km

Sens

Evt Alarmes

Liaison AB 1310 15.sor

1310


1.521

43.29

5.309

Site A -> Site B

1

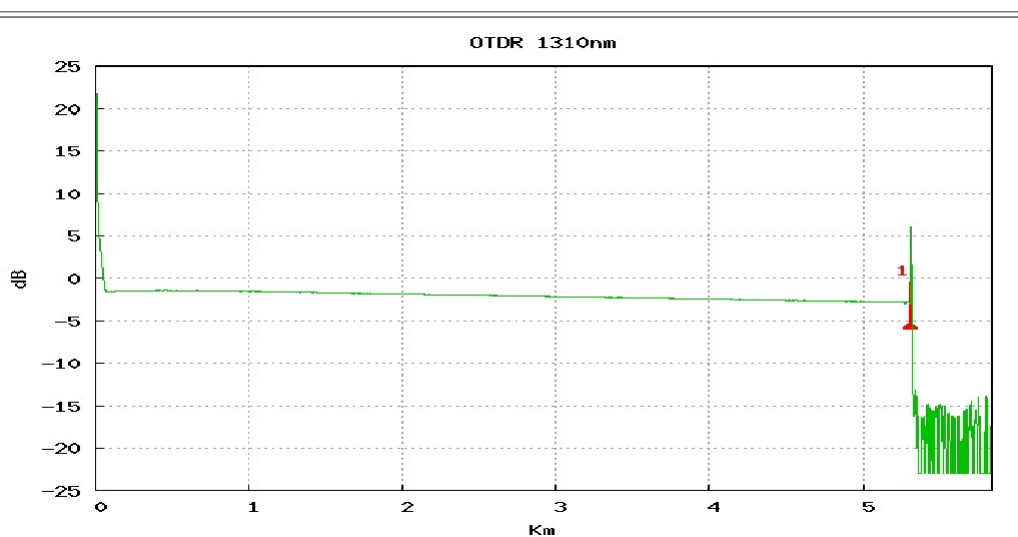

Evt	Distance	Affaib.	Réfect.	Pente	Section	Bilan
	Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
1	5.309		-45.00	0.311	5.309	1.521
