



Nom Câble :

Origine : Site B

Id travail :

Nom Fibre : Fiber 23

Extrémité : Site A

Opérateur :

MTS 4000(S/N 26426)

4136 MA(S/N 28613)

Date : 16/08/2018 19:18

Setup

OTDR

Alarmes

Seuils

None

Résumé

Nom Fichier

Liaison BA 1550 23.sor

Laser nm Bilan dB ORL Liaison dB Fin de fibre Km

1550

1.170

38.36


5.311

Sens

Site B -> Site A

Evt Alarmes

2

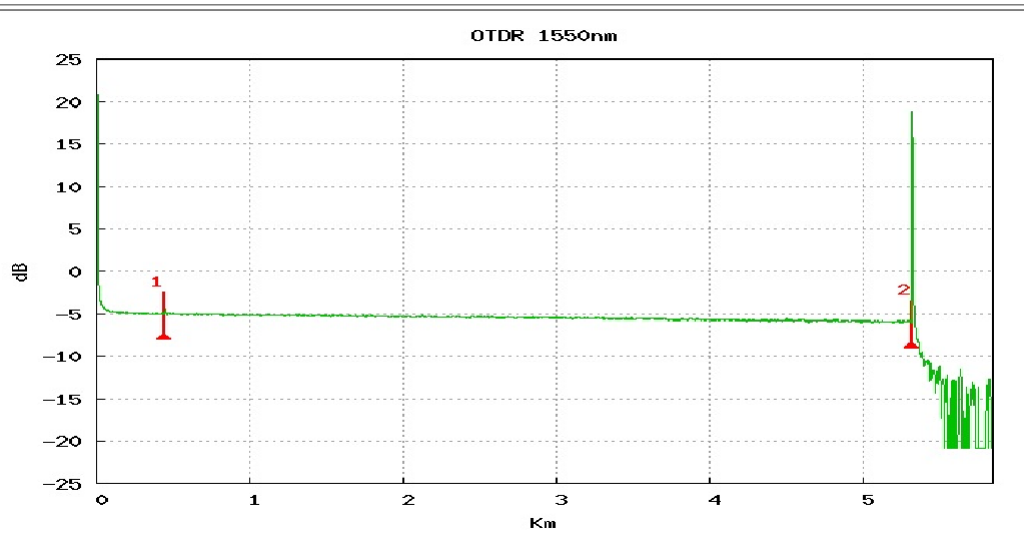

Evt	Distance	Affaib.	Réfect.	Pente	Section	Bilan
	Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
1	0.441	-0.024	-70.07	0.703	0.441	
2	5.311		-15.36	0.181	4.869	1.170
